



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Praça Juscelino Kubitschek, s/n – CEP 35420-000 – Minas Gerais
(31) 3557-9003

Ofício nº 169/2021/SEGOV

Mariana, 27 de maio de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
Ronaldo Alves Bento
Vereador Presidente da Câmara Municipal de Mariana

Assunto: Requerimento 107/2021

Câmara Municipal de Mariana

Protocolado sob nº 382

Em 28/05/21/9:32

Scarlett Paula

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Em resposta ao requerido à Prefeitura de Mariana, objetivando obter informações na Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana, encaminho a resposta apresentada através da CI nº 452, em anexo.

Cordialmente apresento votos de estima, permanecendo à disposição para o que for necessário.

Atenciosamente,


Edvaldo Santos de Andrade
Secretário Municipal de Governo



GABINETE DO VEREADOR JOSÉ ANTUNES VIEIRA

Rua Wenceslau Braz, 18 – Centro – Telefone: 3558-1570

email: vereadorzezinhosalete@gmail.com

Requerimento nº 407/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

PROPOSTA Nº 107

19/04/21 / 13:04

Stallit Paulo

Excelentíssimo senhor
Ronaldo Alves Bento
Presidente da Câmara Municipal de Mariana


Dileto Plenário,



O vereador da Câmara Municipal de Mariana, JOSÉ ANTUNES VIEIRA, no uso de suas atribuições legais e regimentalmente amparado, apresenta a Mesa, que ouvido o Plenário e após aprovado, requer que seja encaminhado o presente procedimento ao Chefe Interino do Poder Executivo, Sr. Juliano Vasconcelos Gonçalves e ao Secretário Municipal de Obras, requerendo as seguintes informações sobre a obra iniciada na Praça Guilherme, na comunidade de Mainart.

- Quando iniciou-se a referida obra?
- Qual projeto será executado na referida praça? Encaminhar o projeto.
- Qual empresa responsável pela execução da obra? Apresentar ART do responsável técnico.
- Qual a forma de contratação da referida empresa? Licitação, adesão de ata ou outro?
- Qual o motivo da paralisação da referida obra? Qual a data da paralisação? Qual data da previsão da retomada da obra?
- Qual o valor total da referida obra?
- Qual o valor pago até a presente data? Apresentar detalhadamente as medições e os respectivos pagamentos.

Saudações Legislativas,

Mariana, 19 de Abril de 2021.


José Antunes Vieira
Vereador - MDB

CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA
APROVADO POR UNANIMIDADE
EM 20 / 4 / 2021
 Presidente  Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano

CI - Comunicação Interna

Nº 452

Data:
27/05/2021

De: Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana

Para: Secretaria Municipal de Governo

Assunto: Resposta ao Requerimento 107/2021

Prezados,

Em resposta ao requerimento 107/2021, informamos que a Reforma da Praça São Guilherme foi iniciada no dia 09 de Outubro de 2020 e por se tratar de uma reforma não existe projeto. A reforma foi executada pela empresa Construtora Israel Eireli e a forma de contratação foi através da adesão de Ata.

Devido a falta de itens no quantitativo da empresa, foi necessário a paralisação da reforma e até o momento, não existe planejamento definido de retomada. O valor estimado da referida obra é de R\$240.027,92 e até o presente momento foi pago o valor de R\$24.412,63.

Encaminhamos, em anexo, Notas fiscais, Primeira medição, Segunda medição e Relatórios Fotográficos.

André Lima Belico
Secretário Municipal de Obras e Gestão Urbana


Local de entrega:

Recebido em/...../2021

Assinatura: _____

Nome completo

Carimbo: _____

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Prefeitura Municipal de Brumadinho

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Codigo de Verificação para Autenticação: 4fbca66c6168b4462b66f7ec442b4686



Gerado em 25/11/2020 17:33:27

Data de Emissão 25/11/2020	Exigibilidade de ISS Tributação no Município	Regime Tributário Microempresa Municipal (ME)	Número RPS	Série PADRAO	Nº da Nota Fiscal 2602
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte		Local de Prestação Fora do Município (3140001 - MARIANA - MG)			
Simples Não Optante					

PRESTADOR**Razão Social: CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI**

Nome Fantasia: CONSTRUTORA ISRAEL

Endereço: RUA GOVERNADOR VALADARES, 75, UNID IV 3º PAVIMENTO - CENTRO

Brumadinho - MG - CEP. 35480-000

E-mail: eficaz@oi.com.br - Fone: (31)3571-2047 - Celular: (31)3392-0129 - Site:

Inscrição Estadual: 0901357920010 - Inscrição Municipal: 0000060 - CPF/CNPJ: 04.565.082/0001-72

TOMADOR**Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA**

Endereço: Praça PRACA JK, S/N, - CENTRO

Mariana - MG - CEP: 35420-000

E-mail: - Fone: (31)3557-9000 - Celular:

Inscrição Estadual: CPF/CNPJ: 18.295.303/0001-44

SERVIÇO

7.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concr

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1º Medição, ref. prestação de serviços de manutenção, conservação e reparos da praça do distrito de Mainart

Período: 09/10/2020 à 08/11/2020

Empenho: 566639

DADOS BANCÁRIO

BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 6548

CONTA CORRENTE: 83-3

"Inaplicabilidade da retenção de INSS conforme artigo 149 da Instrução normativa 971/2009"

"LEI DA TRANSPARÊNCIA 12.741/2012, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 8,65%, CORRESPONDE AO ISS, PIS E COFINS"

Fábio Fernandes Vieira
Secretário Municipal de Obras
e Saneamento

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESC. INCO. (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
1.992,45	1.195,47	0,00	796,98	5,000000	39,85
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTOS DIVERSOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.952,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

O ISSQN DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA É DEVIDO NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.brumadinho.mg.gov.br>

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEREIRA MUNICIPAL DE MARIANA


PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS EM PRAÇA DO DISTRITO DE MAINART

LICITAÇÃO: PRC 300/2019 - PREGÃO N.º 120/2019

CONTRATO : 447/2019

DIÁRIA MED. C.A.C. Nº: 01
 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 09/10/20 A 08/11/20
 VALOR ESTIMADO: R\$ 240.027,92
 DATA: 09/11/2020
 VALOR A SER PAGO: R\$ 238.035,47

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR		ESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		VALOR DO CONTRATO			
				Preço Unit.	Quant. Contratual	Preço total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total
				Unid.		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$
19.1	SETOP	SPDA-AT-005	ATERRIAMENTO COM F.O. PARA PARABAIOS, COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO "DOOPERFIELD"	R\$	782,27	-	-	-	0,00	R\$	-	-	0,00	R\$	-	-
19.2	SETOP	ED-13939	CABO DE COBRE NU 1/2"X4MM ² - 7 FIOS X 2,08MM, PARA BLENDETES DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CIMENTAÇÃO/DESCIDA (S/D), INCLUSIVE SUPORTE EM FERRO FUNDIDO	m	19,44	-	-	-	0,00	R\$	-	-	0,00	R\$	-	-
19.3	SETOP	SPDA-CXS-025	CARCA DE INSPEÇÃO EM CIMENTO ASREGADO 300X300MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO	m	331,77	23,00	3.030,71	-	0,00	R\$	-	23,00	0,00	R\$	3.030,71	-
19.4	SETOP	SPDA-VOL-025	SOLDA EXOTÉRMICA ACO DE HCL-3/4-50-5 CONCRETO	m	173,91	-	-	-	0,00	R\$	-	-	0,00	R\$	-	-
20.1	SINAPI	9-3966	CONCRETO FCK = 30MFA, TRAÇO 1:1,25 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m³	322,32	-	-	-	0,00	R\$	-	-	0,00	R\$	-	-
20.2	SINAPI	9-3965	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m³	312,77	-	-	-	0,00	R\$	-	-	0,00	R\$	-	-
20.3	SINAPI	9-9570	CONCRETO FCK= 20MFA, TRAÇO 1:1,75 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	m³	294,26	-	-	-	1,75	R\$	516,25	1,75	0,00	R\$	516,25	-
20.4	SETOP	DRE-COM-005	CONCRETO PARA BÊNÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6 INCLUSIVE ANCAMENTO	m³	345,91	-	-	-	0,00	R\$	-	-	0,00	R\$	-	-
20.5	SINAPI	9-5562	CONCRETO MAGRO PARA LASHO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m³	255,24	-	-	-	0,00	R\$	-	-	0,00	R\$	-	-
20.6	SINAPI	9-2874	ANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m³	25,09	-	-	-	0,00	R\$	-	-	0,00	R\$	-	-
27	SUDECAP	40-22.10	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS C/ DESC. LATERAL H=1,5M	m³	3,79	-	-	-	0,00	R\$	-	-	0,00	R\$	-	-
27.1	SUDECAP	40-22.11	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS DESC. LATERAL 1,5M H=3,0M	m³	4,78	-	-	-	0,00	R\$	-	-	0,00	R\$	-	-
27.2	SETOP	TER-REG-010	REG. E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA A EQUIVALENTE	m²	2,52	-	-	-	0,00	R\$	-	-	0,00	R\$	-	-
27.3	SINAPI	74-15/001	ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE LA CAT DMT 50M COM MOTOR SOBRE ESTEIRAS 3/4 HP COM LAMINA E ESCANIFICADOR	m³	1,59	-	-	-	0,00	R\$	-	-	0,00	R\$	-	-
27.4	SETOP	TER-ESC-015	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	3,54	574,67	2.034,33	-	0,00	R\$	-	2.034,33	0,00	R\$	2.034,33	-
27.5	SETOP	TER-ESC-020	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	m³	4,72	-	-	-	0,00	R\$	-	-	0,00	R\$	-	-
27.6	SUDECAP	03-13.01	TRANSPO. DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	m³	2,57	574,67	1.476,90	-	0,00	R\$	-	1.476,90	0,00	R\$	1.476,90	-
27.7	SUDECAP	03-13.02	TRANSPO. DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	4,90	-	-	-	0,00	R\$	-	-	0,00	R\$	-	-
27.8	SUDECAP	03-13.03	TRANSPO. DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	m³	2,21	-	-	-	0,00	R\$	-	-	0,00	R\$	-	-
27.9	SUDECAP	03-13.04	TRANSPO. DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	m³	1,32	-	-	-	0,00	R\$	-	-	0,00	R\$	-	-
27.10	SUDECAP	03-13.04	TRANSPO. DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	m³	0,86	-	-	-	0,00	R\$	-	-	0,00	R\$	-	-
27.11	SINAPI	52-50	PAVIMENTADA MEXKAL, DMT ASOMA DE 30MM (UNIDADE: MEXK V)	m²	17,81	-	-	-	0,00	R\$	-	-	0,00	R\$	-	-
27.12	SUDECAP	03-15.02	ATERRO COMPACTADO COM CGM PLACA VIBRATÓRIA	m³	17,81	-	-	-	0,00	R\$	-	-	0,00	R\$	-	-
27.13	SETOP	TER-AT-005	ATERRO COMPACTADO COM RIGLO VIBRATÓRIO SEM GRAU DE COMPACTAÇÃO	m³	1,14	574,67	655,12	-	0,00	R\$	-	655,12	0,00	R\$	655,12	-
27.14	SETOP	TER-REG-015	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM RIGLO VIBRATÓRIO	m²	1,27	-	-	-	0,00	R\$	-	-	0,00	R\$	-	-
27.15	SUDECAP	03-22.02	REATERRO DE VALAS COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATÓRIA OU EQUIVALENTE	m³	17,81	-	-	-	0,00	R\$	-	-	0,00	R\$	-	-
27.16	SINAPI	7-005/2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC=95% PO FN (AREAS)	m²	5,54	-	-	-	0,00	R\$	-	-	0,00	R\$	-	-
27.17	SINAPI	79-572	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m²	0,47	540,19	540,19	-	0,00	R\$	-	540,19	0,00	R\$	540,19	-
27.18	SETOP	TER-ESC-010	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRENO (RESATEIRO MANUAL)	m³	28,70	-	-	-	0,00	R\$	-	-	0,00	R\$	-	-


 Secretário Municipal de Obras e Gestão Urbana

Mariana
 Coordenadora de Obras e Gestão Urbana

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO








CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINHA		RECETOIMEDIÇÃO Nº:											
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS EM PRAÇA DO DISTRITO DE MARINHA		PERÍODO DE MEDIÇÃO: 05/10/20 A 08/11/20											
LICITAÇÃO: PRC 300/2019 - PREGÃO Nº 120/2019		MAIOR ESTIMADO: R\$ 240.027,92											
CONTRATO: 447/2019		DATA: 09/11/2020											
		R\$ 1.992,45 SALDO ATUAL:											
		R\$ 238.035,47											
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ACUMULADO ANTERIOR:		VALOR DO CONTRATO		RENDARIZADO DO PERÍODO		MEDIDO TOTAL:		SALDO DO CONTRATO	
				Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual	Preço Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total
28	SETOP	RO-42988	AREIA, COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESPALHAMENTO E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS)	m³	R\$ 53,47	20,93	R\$ 1.119,13	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	20,93	R\$ 1.119,13
37	SETOP	URB-MFC-005	MEDICAMENTO DE CONCRETO PRE-VENDIDO TIPO A - (12 X 5,7 X 3,5 CM, INCLUSIVE ESCAVACÃO E REATERC)	m	R\$ 43,64	500,89	R\$ 21.858,84	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	500,89	R\$ 21.858,84
37.2	SETOP	ED-14762	ARGILA DE CONCRETO UREARDO (SCU), TIPO 1, COM EQ. 15 MPa, ARGILA DE 50CM COM INCLUSAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEDIÇÃO, INCLUSIVE ESCAVACÃO, APILAMENTO E PRAÇA	m	R\$ 23,19		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
38.1	SETOP	BM-RR-005	BARCO DE ARDUM EM CONCRETO APARENTE, ACABAMENTO EM VERNIZ, E = 8 CM, 200 X 40 X 55 CM, SEM ESCOSTO	un	R\$ 160,56	29,00	R\$ 4.656,24	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	29,00	R\$ 4.656,24
38.2	SETOP	RC-11665	ARFEGO EQUIPO DE PASSAGEIROS PRÉ-MONTADO (EXECUÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM)	un	R\$ 4.947,26	1,00	R\$ 4.947,26	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 4.947,26
38.3	SUDECAP	Z-40.02	MEIRA TIPO 2-METALICA INDIVIDUAL BASCULANTE CH/PA 20 3E.	un	R\$ 135,10	5,00	R\$ 810,60	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	5,00	R\$ 810,60
38.4	SUDECAP	Z-40.04	MEIRA TIPO 4-PLAST. CONJUNTA 90.- 55080-01-4P MITRAEQUVALENTE.	un	R\$ 660,29	4,00	R\$ 2.641,16	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 2.641,16
40	SETOP	JM-GER-005	IMPREGNAÇÃO PARA ENTREGA DA OBRA	m²	R\$ 4,93		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
40.2	SINAPI	Z-2897	ZANGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE EM	m³	R\$ 19,17		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
40.3	SINAPI	S-2914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM, (UFIDADE: MEXXVI).	m³/km	R\$ 1,69		R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
				TOTALS ->		R\$ 240.027,92	R\$ 0,00	R\$ 1.992,45	R\$ 1.992,45	R\$ 238.035,47			


Engenheiro fiscal

Supervisor Gerenciamento de Obras

Secrário Municipal de Obras e Gestão Urbana

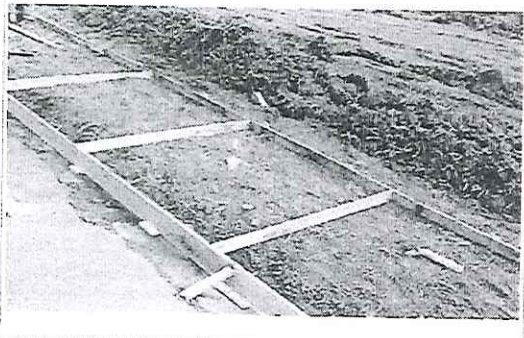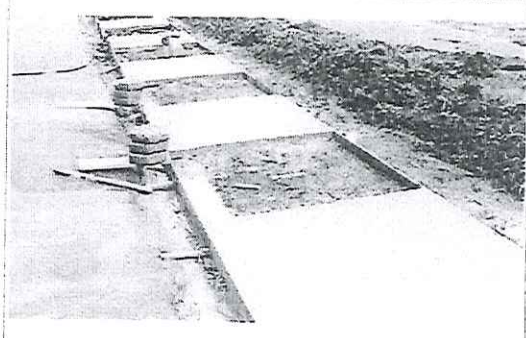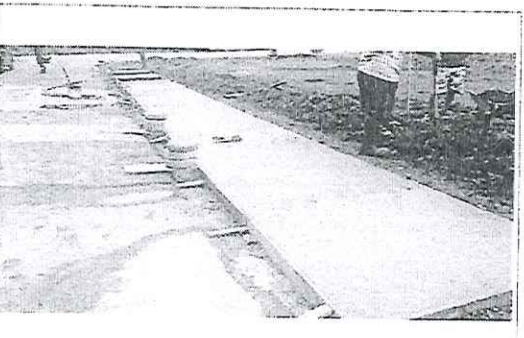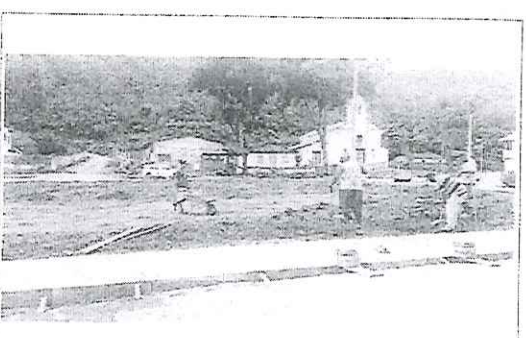

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		01/01
Projeto/Obra/Serviço: DISTRITO DE MAINART	Contrato: 447/2019	Medição: 1
Período de Execução: 09/10/2020 A 08/11/2020	Empresa Contratada: CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI - CNPJ: 04.565.082/0001-72	Situação: <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final
Descrição: 1ª MEDIÇÃO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA PRAÇA DO DISTRITO DE MAINART		
		
CONCRETO FCK= 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA, BRITA1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L	CONCRETO FCK= 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA, BRITA1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L	
		
CONCRETO FCK= 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA, BRITA1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L	CONCRETO FCK= 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA, BRITA1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L	
		
Visto/Data/ Construtora Israel Eireli <i>[Signature]</i> Engenheiro Civil CREA 183092/D	Visto/Data/ Fiscalização <i>[Signature]</i> Fábio Fernandes Vieira Secretário Municipal de Obras e Gestão Urbana	



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
Prefeitura Municipal de Brumadinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Código de Verificação para Autenticação: c1c850da67a84db4692241d4ecc37e7a




Gerado em 18/12/2020 10:06:44

Data de Emissão 18/12/2020	Exigibilidade de ISS Instituição no Município	Regime Tributário Microempresa Municipal (ME)	Número RPS	Série PADRAU	Nº da Nota Fiscal 2696
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte		Local de Prestação Cora do Município (3140001 MARIANA MG)			

PRESTADOR

Razão Social: CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI
 Nome Fantasia: CONSTRUTORA ISRAEL
 Endereço: RUA GOVERNADOR VALADARES, 75, UNID IV 3º PAVIMENTO - CENTRO
 Brumadinho - MG - CEP: 35460-000
 E-mail: eficaz@ol.com.br - Fone: (31)3571-2047 - Celular: (31)3392-0129 - Site:
 Inscrição Estadual: 0901357920010 - Inscrição Municipal: 0000060 - CPF/CNPJ: 04.565.082/0001-72



TOMADOR

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
 Endereço: Praça PRACA JK, S/N, - CENTRO
 Mariana - MG - CEP: 35420-000
 E mail: Fone: (31)3557 9000 Celular:
 Inscrição Estadual: CPF/CNPJ: 18.295.303/0001-44

SERVIÇO

7.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concr

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2º Medição, ref. prestação de serviços de manutenção, conservação e reparos da praça do distrito de Mainart

Período: 09/11/2020 à 08/12/2020

Empenho: 56301

DADOS BANCÁRIO
 BANCO BRADESCO
 AGÊNCIA: 6548
 CONTA CORRENTE: 83-3

"Inaplicabilidade da retenção de INSS conforme artigo 149 da Instrução normativa 971/2009"

"LEI DA TRANSPARÊNCIA 12.741/2012, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 8,65%, CORRESPONDE AO ISS, PIS E COFINS"

[Handwritten signature]

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESC INCO (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
22.420,18	13.452,11	0,00	8.968,07	5,000000	448,40
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.971,78

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

O ISSQN DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA É DEVIDO NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS EM PRAÇA DO DISTRITO DE MARINARI

LICITAÇÃO: PIC 300/2019 - PREGÃO Nº 120/2019

CONTRATO: 447/2019

BOLETIM MEDIÇÃO Nº: 02
 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 09/11/20 A 08/12/20
 VALOR ESTIMADO: R\$ 240.027,92
 DATA: 09/12/2020

ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ACUMULADO ANTERIOR				VALOR DO CONTRATO	REALIZADO AC PERÍODO				ACUMULADO TOTAL				SALDO DO CONTRATO
				Unid.	Preço Unit.	Quant. Contratual	Preço Total		Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	
1			MOBILIZAÇÃO DE OBRAS														
1.7	SUDECAP	01.39.10	DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO	mês	R\$ 589,78		R\$ -										
1.8	SUDECAP	01.39.01	BANHEIRO QUÍMICO 110V/120X230CM COM MANUTENÇÃO	mês	R\$ 643,40	1,00	R\$ 643,40										
1.9	SUDECAP	4..72.02	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA	un	R\$ 487,09		R\$ -										
1.10	SUDECAP	4..72.01	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	un	R\$ 240,80		R\$ -										
1.11	SUDECAP	0..03.02	PLACA DE OBRA EM LOVA IMPRESSÃO DIGITAL P. SUDECAP	m²	R\$ 215,86	1,00	R\$ 215,86										
1.12	SINAPI	58459	TAPUME COM TELHA MET. ALCA.	m²	R\$ 82,92		R\$ -										
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL:														
2.1	SINAPI	96778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA, FIENHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	R\$ 93,07	220,00	R\$ 20.475,40										
2.2	SUDECAP	55.10.33	ENCARGADO GERAL DE OBRA	h	R\$ 33,55	220,00	R\$ 7.381,00										
3			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA:														
3.1	SETOP	MOB-DES-090	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - OBRAS COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,00 (0,20%)	%			R\$ -										
3.2	SETOP	MOB-DES-025	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,00 E 3.000.000,00 (0,30%)	%			R\$ -										
3.3	SETOP	MOB-DES-020	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - OBRAS COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 (0,50%)	%	R\$ 170.769,00	0,50	R\$ 85.385										
5			SUPRESSÃO VEGETAL:														
5.1	SINAPI	73659/001	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CANADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRA:	m²	R\$ 0,14	1.149,33	R\$ 160,91										
5.2	SETOP	RC-42488	CORTE DE ARVORE NATIVA COM TAPPO - SERRA Ø >= 0,30M - A T 1,00M JUNDA DES	un	R\$ 37,75		R\$ -										
10			PISO:														
10.7	SINAPI	52398	EXECUÇÃO DE PÁTIO ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO DE ANGULAR COM INSTALAC DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 E 2M	m²	R\$ 56,99	418,53	R\$ 23.852,02										
10.8	SINAPI	54991	EXECUÇÃO DE PASSOIO "CALZADA" CU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LUGO, USUADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	m²	R\$ 481,77	202,50	R\$ 97.558,43										
10.9	SETOP	PIS.-AD-035	COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INC LUSIVE FORNCEMENTE E PISO POCCTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	m²	R\$ 74,32		R\$ -										
10.10	SETOP	PIS.-AD-040	COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INC LUSIVE FORNCEMENTE E PISO POCCTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	m²	R\$ 74,32		R\$ -										
12			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:														
12.31	SUDECAP	11.-4.05	CABO FLEXÍVEL NÃO HA-GGPHC # 2,5 MM2, ISOLAMENTO 750V	m	R\$ 2,24		R\$ -										
12.32	SUDECAP	11.-4.06	CABO FLEXÍVEL NÃO HA-GGPHC # 4,0 MM2, ISOLAMENTO 750V	m	R\$ 3,29	818,00	R\$ 2.691,22										
19			SPDA:														
19.1	SETOP	SPDA-ATE-005	ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS , COM HASTES DE COBRE COM ALUMA DE AÇO TIPO "ZAPPENVELO"*	un	R\$ 782,27		R\$ -										
19.2	SETOP	ED-19359	CABO DE COBRE NU #250MM2 - 7 FIC#2,06MM, PARA ELEMENTOS DE ADAPTAÇÃO ANEL DE CONTINUIDADE/DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE	m	R\$ 19,44		R\$ -										
19.3	SETOP	SPDA-CX5-025	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CIMENTO AGREGADO 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO	un	R\$ 131,77	23,00	R\$ 3.030,71										
19.4	SETOP	SPDA-SOL-025	SOLDA EXOTÉRMICA MOLDE ICL-3/4-50-5	un	R\$ 173,91		R\$ -										



Mariana, 09 de Dezembro de 2020.
 Engenheiro Civil
 [Assinatura]

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA PRAÇA DO DISTRITO DE MAINART

LICITAÇÃO: PRC 300/2019 - PREGÃO Nº120/2019

CONTRATO : 447/2019

BOLETIM / EMISSÃO Nº: 02
 PERÍODO DA MEDIÇÃO: 05/11/20 A 08/11/20
 VALOR ESTIMADO: R\$ 240.027,92
 DATA: 09/11/2020

ITEM	REF.	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR		ESTA MEDIÇÃO		ACUMULADO TOTAL		SALDO DO CONTRATO	
				Preço Unit.	Quant. Contratual	Preço Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total	Quant.	Valor Total
27	SETOP	TER-ESC-015	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA:											
27.5	SETOP	TER-ESC-015	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	R\$ 3,54	574,67	R\$ 2.034,33		R\$ -	0,00		0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
27.6	SETOP	TER-ESC-020	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	R\$ 4,72	574,67	R\$ 2.716,90		R\$ -	0,00		0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
27.7	SUDECAP	05.1.01	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUA QUER NATUREZA DENTR <= 13M	R\$ 2,57	574,67	R\$ 1.476,90		R\$ -	0,00		0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
27.13	SETOP	TER-MTE-005	ATERRO COMPACTADO COM RELO VIBRATÓRIO SEM GRAU DE COMPACTAÇÃO	R\$ 1,14	574,67	R\$ 655,12		R\$ -	0,00		0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
27.14	SETOP	TER-FEG-015	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLLO VIBRATÓRIO	R\$ 1,27		R\$ -		R\$ -	0,00		0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
27.15	SUDECAP	05.22.02	REATERRO DE VALAS COMPLETADO COM EQUIP. PLACA VIBRATÓRIA OU EQUIVALENTE	R\$ 17,81		R\$ -		R\$ -	0,00		0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
27.16	SINAPI	7-005/2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO Q.C. = 95% DO PN (AREIAS)	R\$ 5,54		R\$ -		R\$ -	0,00		0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
27.17	SINAPI	7-972	COMPACTADORA JACOPE E RELO: COMPRESSOR VIBRATÓRIO 80 HP)	R\$ 0,47	1.149,33	R\$ 540,19		R\$ -	0,00		0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
27.18	SETOP	TER-ESC-050	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM TERRA COM MOTONIVELADORA.	R\$ 28,70		R\$ -		R\$ -	0,00		0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
28			ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DEZATERRA MANUAL)											
			AREIA:											
			COLCHÃO CREMANTE DE AREIA (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESPALHAMENTO E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGRÉGADOS)											
28.1	SETOP	RC-0988	MEIO RDO	R\$ 53,47	20,93	R\$ 1.119,13		R\$ -	0,00		0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
37			MEIO RDO											
37.1	SETOP	URB-MFC-005	MEIO RDO DE CONCRETO PRE-MOLDADO TIPO A - (12 X 12 X 7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	R\$ 43,64	500,89	R\$ 21.858,84		R\$ -	111,60	R\$ 4.844,64	111,60	R\$ 4.844,64	399,89	R\$ 17.014,80
38			PRAÇA:											
38.1	SETOP	BAN-AR-005	BANCO DE JARDIM EM CONCRETO APARENTE, ACABAMENTO EM VERNIZ, E = 8 CM, 200 X 40 X 55 CM, SEM ENCOSTO	R\$ 160,56	29,00	R\$ 4.656,24		R\$ -	0,00		0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
38.2	SETOP	RC-11655	MBRIGO DUPLO DE PASSAGENS PRE-MOLDADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM)	R\$ 4.947,26	1,00	R\$ 4.947,26		R\$ -	0,00		0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
38.3	SUDECAP	ZL-0.02	AREIA, TIPO 2 METÁLICA INDIVIDUAL, BASCULAVEL CHAPA 20 351	R\$ 135,10	6,00	R\$ 810,60		R\$ -	0,00		0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
38.4	SUDECAP	ZL-0.04	AREIA, TIPO 4 PLAST.COM, C/4 BDL - 55080-01,4P MITRAVEQUIVA ENTE.	R\$ 660,29	4,00	R\$ 2.641,16		R\$ -	0,00		0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
40			IMPEZA:											
40.1	SETOP	LIM-GER-005	IMPEZA FINAL PARA ENTREEA 3A CBR	R\$ 4,93		R\$ -		R\$ -	0,00		0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
40.2	SINAPI	72957	CARGA ANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³	R\$ 19,17		R\$ -		R\$ -	0,00		0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
40.3	SINAPI	57924	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAZIMENTADA, DENTR ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	R\$ 1,69		R\$ -		R\$ -	0,00		0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
				TOTAIS ->			R\$ 200.027,92	R\$ 0,00	R\$ 22.420,18		R\$ 22.420,18		R\$ 217.607,74	

Engenheiro Civil
 CREA A 150000

Marcos Paulo da Costa - CREA-MG - 88392/D
 Responsável Técnico/Contratada

(Fábio Fernandes Vieira - CREA-MG 36598/D)
 Secretário Municipal de Obras e Gestão Urbana



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

01/02

Projeto/Obra/Serviço: DISTRITO DE MAINART	Contrato: 447/2019	Medição: 2
Período de Execução: 09/11/2020 A 08/12/2020	Empresa Contratada: CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI - CNPJ: 04.865.082/000171	Situação: <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final

Descrição:
2ª MEDIÇÃO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA PRAÇA DO DISTRITO DE MAINART




DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS



DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS



DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA SANTA, SÃO TOMÉ), INCLUSIVE AFASTAMENTO

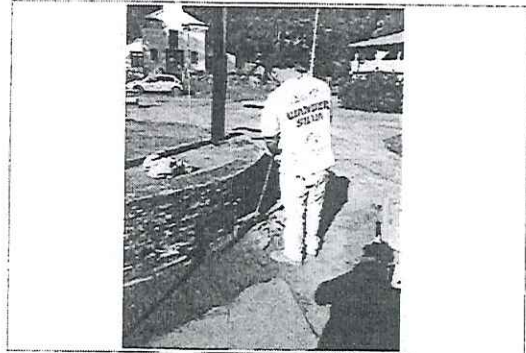

DEMOLIÇÃO DE PISO DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, LAGOA SANTA, SÃO TOMÉ), INCLUSIVE AFASTAMENTO



ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA



ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

Visto/Data/ Construtora Israel Eireli





Visto/Data/ Fiscalização



Engenheiro Civil
C.R.S. 123456

[Handwritten signature]

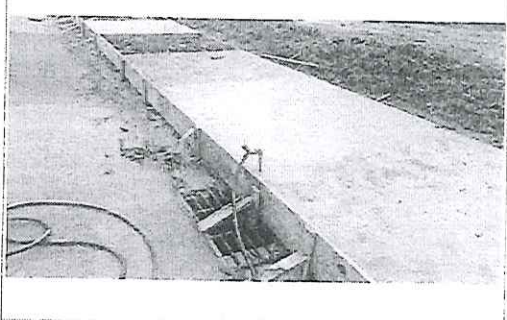

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO		02/02
Projeto/Obra/Serviço: DISTRITO DE MAINART	Contrato: 447/2019	Medição: 2
Período de Execução: 09/11/2020 A 08/12/2020	Empresa Contratada: CONSTRUTORA ISRAEL EIRELI - CNPJ: 04.965.082/0001-72	Situação: <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final
Descrição: 2ª MEDIÇÃO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DA PRAÇA DO DISTRITO DE MAINART		
		
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	
		
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	
		
Visto/Data/ Construtora Israel Eireli	Visto/Data/ Fiscalização	

[Handwritten signature]
Engenheiro Civil
ISAEL EIRELI

[Handwritten signature]
