



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.
Unidade Administrativa: Rua do Seminário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.
www.camarademariana.mg.gov.br • Telefone: (31) 3557-6200

**RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA NA OBRA QUE ESTÁ SENDO
CONSTRUÍDA O QUARTEL DA GUARDA MUNICIPAL ATENDENDO AO
OFÍCIO Nº102/2023 DE AUTORIA DO VEREADOR FERNANDO SAMPAIO
DE CASTRO NO DIA VINTE E SEIS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E
TRÊS.**

Data: 26/10/2023

Endereço: Bairro Cruzeiro do Sul

Objetivo: Visita técnica na obra em que está sendo construído o Quartel da Guarda Municipal (GCM)

Vereadores presentes: José Antunes e Fernando Sampaio.

Representantes do local: Marta Guido-Secretária de Segurança Pública, Adriano Martins Costa- Defesa Civil, Wesley Ferreira-Defesa Civil, João Paulo Felipe-Subsecretário público, Rodrigo Ferreira- Empresa Terra e Técnica, Luiz Gonçalves- PMM, Ricardo Guerra-PMM, Julia de Paula- Terra e Técnica, Yuri Albuquerque- Terra e Técnica, Felipe Coelho- Viavoz, Carlos Antunes- Secretaria de obras, Leonel Braz- Guarda Municipal, Matheus Philipe-ViaVoz.

Ao vigésimo sexto dia do mês de outubro de dois mil e vinte e três, às quinze horas e dez minutos, o Vereador Fernando Sampaio acompanhado dos responsáveis da Secretaria de Obras, Secretaria de Segurança Pública, membros da empresa ViaVoz, membros da empresa Terra e técnica, Guardas Municipais e Policiais Militares estiveram no Bairro Cruzeiro do Sul para promover visita técnica na obra do Quartel da Guarda Municipal com o objetivo de avaliar o status em que se encontra a mesma. **Participaram da Visita:** O Vereador Fernando Sampaio, Vereador José Antunes, Marta Guido-Secretária de Segurança Pública, Adriano Martins Costa, Defesa Civil, Wesley Ferreira, Defesa Civil, João Paulo Felipe, Subsecretário público, Rodrigo Ferreira, Terra e Técnica, Luiz Gonçalves, PMM, Ricardo Guerra, PMM, Julia de Paula, Terra e Técnica, Yuri Albuquerque, Terra e Técnica, Felipe Coelho, Viavoz, Carlos Antunes, Secretaria de obras, Leonel Braz, Guarda Municipal, Matheus Philipe, ViaVoz. **Visita técnica na obra do Quartel da Guarda Municipal no Bairro Cruzeiro do Sul.** O Vereador Fernando Sampaio iniciou dizendo presenciaram que a obra está em andamento e acredita que em quarenta dias a obra já



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.

Unidade Administrativa: Rua do Seminário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.

www.camarademariana.mg.gov.br • Telefone: (31) 3557-6200

esteja “tijolada”. O Sr. Rodrigo Araújo disse que farão a estrutura primeiro para ganharem tempo, de forma a terem a laje para trabalhar embaixo, tendo em vista o período chuvoso. Seguidamente o Vereador Fernando Sampaio disse que a empresa Via-Voz foi chamada mas precisam ser sinceros, porque quando foi falado do erro do projeto, explicando que não existia porque houve a troca de local e quando tem a troca, obviamente a realocação do projeto não dá certo. Lembrou que no antigo local não foi possível devido ao impedimento do IPHAN, que apontou que “agrediria” o Centro Histórico. Destacou que não existe obra parada e que obviamente quando se muda de local leva-se um tempo para adequação, mas que veem que tudo está adequado. Seguidamente, a secretária da Casa, Patrícia Gomes, questionou se o Vereador Fernando Sampaio acompanharia a obra e se manteria um cronograma. O Vereador Fernando Sampaio expôs que acompanharia e que a cada medição voltavam, tendo em vista que precisa assinar como membro da Câmara, já que se designou como presidente a acompanhar a obra e lembrou que assinou somente uma medição. Com a palavra, o Sr. Matheus Philippe disse que existe um decreto designando uma comissão de acompanhamento de obra e que o Vereador faz parte. Com a palavra, a Sra. Marta Guido disse que é necessário um membro do Legislativo. Seguidamente, o Sr. Ricardo Guerra disse que combinaram mensalmente de reunir-se para fazer o acompanhamento. O Vereador Fernando Sampaio disse que os comunicaram sobre a reunião, além disso, muitos questionaram no requerimento que a obra estava parada e precisam lembrar que, quando houve a troca do local é necessário entender o tempo de adaptação e que algumas coisas foram mudadas. Destacou novamente que não existe falar em obra parada e que tiveram o contratempo da adequação do projeto. Com a palavra, o Sr. Rodrigo Araújo disse que o tempo de readequação atrasa a empresa e precisam fechar a questão da medição que a obra nunca parou e teve o tempo de readequação, que é um tempo de obra. O Vereador Fernando Sampaio disse que é um momento que não se vê a obra. O Sr. Rodrigo Araújo complementou dizendo que não se vê a obra, mas que era o momento em que estavam trabalhando internamente, com gráficos, repensando o projeto. O Vereador Fernando Sampaio destacou que a vantagem é que a obra não está sendo feita com o dinheiro da prefeitura e sim, de acordo vinculado com a Fundação Renova, salientando que o dinheiro já está em conta e finalizando é feito o pagamento. O Sr. Carlos Antunes questionou qual a previsão para término da obra, o Sr. Rodrigo Araújo informou que em junho de dois mil e vinte e quatro. O Vereador Fernando Sampaio questionou ao Sr. Carlos Antunes, se a medição estava fácil, em resposta, o Sr. Carlos Antunes disse que estavam trabalhando nas adequações ditas e que estavam viabilizando para que esteja tudo adequado. Com a palavra o Vereador Fernando Sampaio disse que futuramente poderia ocorrer de falarem que atrasou, mas já estaria atrasado pois se estão adequando já teria que estar pronto, fora os condicionantes típicos. O Sr. Rodrigo Araújo informou que os levantamentos que deveriam ser feitos, quanto em questão de quantitativos, quanto aos preços referentes, foram feitos mas, havia todo um trâmite para formalizar, e com a readequação, o que restaria era medir e pagar. Pela ordem, o Vereador Fernando Sampaio disse que realmente o que restava era medir e pagar mas que assinou somente a primeira medição



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA


Praça Minas Gerais, nº 89 – Centro, Mariana/MG.


Unidade Administrativa: Rua do Semirário, nº 237 – Centro, Mariana/MG.

www.camarademariana.mg.gov.br • Telefone: (31) 3557-6200

a no mínimo quatro meses atrás, mas que caso houvesse outra medição não haveria passado por ele, tendo em vista que estariam indo para a terceira medição. Com a palavra o Sr. Carlos pediu desculpas pelo equívoco, pois pegaram já em andamento, mas o que puder corrigir, seria o melhor. O Vereador Fernando Sampaio disse que teriam que tomar cuidado com esses pequenos problemas deixados de lado como por exemplo este dele não ter assinado o escopo, nem as duas últimas medições pois sem a assinatura dele não seria válido. O Sr. Carlos informou que o nome de todos consta na Planilha, citando os nomes do Sr Adriano, Sr Stopa, Sra Marta. Com a palavra, Sr Rodrigo Araújo disse que houve esse equívoco no início e que agora não poderia haver mais equívocos. Seguidamente, o Sr. Matheus Felipe disse que quaisquer dúvidas referentes ao projeto a empresa ViaVoz estava a disposição. Posteriormente, o Sr. Rodrigo Araújo lembrou que já acionaram a empresa ViaVoz em relação a uma dúvida de cálculo e prontamente foram atendidos. O Vereador Fernando Sampaio disse que é necessário adequar a terceira medição pois achou que fosse somente a primeira medição. Rodrigo Araújo disse que foram duas medições e que o final do processo da segunda medição ocorreu na semana retrasada, mas que houve um atraso. O Vereador Fernando Sampaio questionou a todos se haveria observações a serem feitas. Em resposta, o Sr. Wesley Stopa disse que não, que o projeto estava caminhando. Finalizando o Sr. Rodrigo Araújo disse que a Guarda Civil Municipal tem acompanhado a obra. **Encerramento:** Ao término da visita, o Vereador Fernando Sampaio, agradeceu a presença de todos. A visita técnica foi encerrada às quinze horas e vinte minutos.


Fernando Sampaio
Vereador


Marta Guido
Secretária de Segurança


José Antunes
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Visita Técnica - Construção do Quartel da Guarda Municipal

Data: 26/10/2023



MARIANA, MG

Apresentação

O vereador Fernando Sampaio, autor do ofício nº 102/2023, compareceu ao lote em que está sendo construído o quartel da Guarda Municipal, juntamente com representantes da Secretaria de Segurança Pública; da Secretaria de Obras; da Defesa Civil; da Guarda Municipal; das empresas Viavoz, e Terra e Técnica; e do poder Executivo para verificar a continuidade da obra do Quarta da Guarda Municipal.

O relatório fotográfico da visita técnica ao lote no bairro Cruzeiro do Sul tem como objetivo registrar as atividades relacionadas à obra e o posicionamento dos representantes dos poderes Legislativo e Executivo frente à situação.





CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Relatório Fotográfico da Visita Técnica à Construção do Quartel da Guarda Municipal

Endereço: bairro Cruzeiro do Sul

1)



2)



3)



4)



OBSERVAÇÕES

Os participantes da visita se encontraram próximo ao lote (fig. 1 e 2) em que está sendo construído o quartel da Guarda Municipal, no bairro Cruzeiro do Sul (fig. 3). O vereador Fernando Sampaio (fig. 4) verificou que a obra está em andamento e acredita que a obra terá avançado bem em 40 dias.

Solicitante da visita

Localização

Data:

Vereador Fernando Sampaio

Cruzeiro do Sul

26/10/2023

Fotografia: Mariana Hermidas (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200


Relatório Fotográfico da Visita Técnica à Construção do Quartel da Guarda Municipal

Endereço: bairro Cruzeiro do Sul

5)



6)

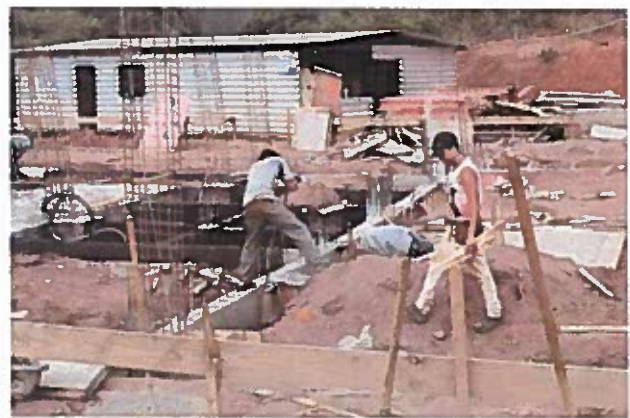

OBSERVAÇÕES

O vereador Fernando Sampaio destacou ainda que houve, de fato, um tempo de readaptação após a troca de local da obra, mas que a obra não estava estagnada. Wesley Stopa, representante da Defesa Civil, afirmou que o projeto está encaminhado (fig. 5 e 6).

Solicitante da visita

Localização

Data:

Vereador Fernando Sampaio

Cruzeiro do Sul

26/10/2023

Fotografia: Mariana Hermidas (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)
