



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

**RELATÓRIO DA VISITA TÉCNICA ATENDENDO AO REQUERIMENTO N.º
82/2023 DE AUTORIA DO VEREADOR GILBERTO MATHEUS PEREIRA,
REALIZADA NO BAIRRO ROSÁRIO, NO DIA VINTE E TRÊS DE MARÇO DE
DOIS MIL E VINTE TRÊS. (23-03-23).**

Data: 23/03/2023

Endereço: Rua Cerejeira, esquina com rua Jequitibá

Objetivo: Verificar a situação da demora no funcionamento da caixa.

Vereadores presentes: Gilberto Matheus Pereira e Ronaldo Alves Bento

Representantes do local: Remo Almeida Machado, SAAE; e José Eloízio, Target Engenharia.

Ao dia vinte e três do mês de março de dois mil e vinte três, quinta-feira, às quatorze horas e doze minutos, foi realizada a Visita Técnica no bairro Rosário atendendo ao requerimento N.º 82/2023 de autoria do Vereador Gilberto Matheus Pereira. **Participaram da Visita:** os Vereadores Gilberto Matheus Pereira e Ronaldo Alves Bento. **Registraram Presença:** Remo Almeida Machado, SAAE; e José Eloízio, Target Engenharia. O Vereador Gilberto iniciou questionando o motivo de uma obra tão simples ainda não ter ficado pronta e passou a palavra para o Vereador Ronaldo, que elogiou o trabalho do colega e o agradeceu pelo requerimento; lembrou ter deixado a Prefeitura com dois reservatórios prontos, um com capacidade de um milhão de litros e outro com capacidade de meio milhão de litros que, inclusive, já havia sido inaugurado. O reservatório de um milhão de litros, na parte mais alta do Rosário, ainda não tinha sido inaugurado, pois estava em acabamento. Mostrou que no reservatório menor só faltava fazer a conexão de um encanamento, que liga a água com o reservatório e disse que a distância era de apenas cinco metros. O Vereador Ronaldo contou que, devido à demora no início da operação do reservatório, o Vereador Gilberto ficou indignado e solicitou esse requerimento. O Vereador contou que o diretor do SAAE (serviço autônomo de água e esgoto) dera um prazo de sete dias para o início da operação e que na segunda-feira (vinte e sete de março de dois mil e vinte e três) o reservatório começaria a funcionar. O Vereador Gilberto falou que ele não se importava com o motivo da caixa não estar em operação, a única coisa que importava é que não está chegando água na casa da população e que continuaria cobrando. Os Vereadores cumprimentaram o representante da Target Engenharia, o Sr. José Eloízio, engenheiro responsável pela obra.



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

O Vereador Gilberto questionou se o engenheiro comparecia todos os dias e reclamou da demora na obra. O engenheiro explicou que o projeto foi feito pensando no abastecimento a ser realizado por baixo e que para isso acontecer, seria necessária toda uma estrutura que não está pronta ainda, por esse motivo a empresa Target decidiu, junto do SAAE, que a entrada seria por cima, a partir de então. O Vereador Gilberto questionou o motivo de terem permitido que o Prefeito Interino à época, o Vereador Ronaldo Bento, inaugurasse a obra sem que ela estivesse totalmente pronta, ficando uma situação complicada para todos os envolvidos e o engenheiro concordou. O Vereador Gilberto perguntou se seria possível usar a caixa na segunda-feira e o engenheiro respondeu que isso dependeria do SAAE, pois o contrato da empresa Target consta apenas referente à instalação do reservatório, já entregue. O Vereador Ronaldo agradeceu pela instalação pela empresa Target, que verificou uma não-conformidade e entregou um relatório com as mesmas, concluindo seu trabalho. O engenheiro disse ter havido uma vistoria da obra por uma empresa contratada pelo SAAE, que aprovou a obra. O Vereador Ronaldo questionou e o engenheiro confirmou que a parte faltante para a obra funcionar ficaria por conta do SAAE, ao que esse disse que, assim como a caixa de meio milhão de litros, a caixa de um milhão de litros não foi entregue, pois o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico Nacional) não autorizou a cor. O Vereador Gilberto disse que quando o Vereador Ronaldo inaugurou a obra, ele pensava estar essa pronta e pressionou o engenheiro para que esclarecesse a data de entrega da mesma. O engenheiro respondeu que a previsão era para janeiro do presente ano, ao que o Vereador respondeu que já estamos em março e que se eles não fossem cobrar, a obra poderia demorar ainda mais. O Vereador Ronaldo disse que quem está atrasado é o SAAE, não a empresa Target. O Sr. Remo, diretor do SAAE, foi cobrado pelo Vereador Gilberto sobre a responsabilidade do SAAE na demora da entrega do reservatório e o Vereador Ronaldo explanou todo o histórico da situação da caixa e questionou sobre a não-conformidade, pois a informação que obteve era de que nenhuma mudança seria necessária; quis saber o motivo de o reservatório funcionar antes e agora não conseguir funcionar da mesma forma. O diretor disse que a ordem de serviço dada pela autarquia e não pela Prefeitura, falou sobre a mudança de fornecimento, que ia deixar de ser por baixo e passaria a ser por cima do solo, sendo que o motivo da demora tinha relação com segurança, não sendo possível encher o tanque sem ter certeza de que ele é seguro para receber tanta água e que o laudo atestando pela segurança do reservatório só foi emitido em março pela empresa Valetec e, por esse motivo não seria possível prever seu término. O Vereador Ronaldo reiterou que o término estava previsto para janeiro, incluindo o tempo para o laudo de segurança. O engenheiro disse que a empresa Target não poderia fazer a validação, tendo sido feita por um terceiro que concluiu faltarem ajustes. O Vereador Gilberto perguntou ao Sr. Remo se na segunda-feira teria água na caixa, ao que esse assentiu, mas disse não ser água para distribuir para a população, mas para fazer testes. O Vereador Ronaldo disse que não importavam os detalhes técnicos, mas o prazo para a água voltar a ser distribuída para a população. O engenheiro disse não estar ciente da demora pela empresa Valetec, ao que o Vereador Ronaldo reclamou da falta de retorno sobre os processos. O engenheiro disse que a forma atual de seguimento da obra era mais eficiente e que a empresa em nenhum momento agiu de má-fé.



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hêlvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

O Vereador Ronaldo reclamou da demora por parte do IPHAN. No segundo ponto da visita, o reservatório maior, o Sr. Remo disse que esse possui um funcionamento diferente daquele do primeiro ponto da visita, sendo que a água ainda não chega a esse, mas há o projeto de trazer a água do Morro Santana e iniciar a pintura em abril. O Vereador Gilberto perguntou se esse projeto interromperia o outro, ao que o diretor disse que ocorreriam em paralelo. Disse, ainda, saber que a caixa seria pintada de verde, mas aguardava uma decisão sobre o tom. O diretor do SAAE disse que isso é importante, pois a caixa era visível do centro histórico ao que o Vereador Gilberto demonstrou surpresa. O engenheiro reafirmou não poder escolher a cor da caixa por conta própria e que aguardava o IPHAN. Disse haver um projeto da adutora que ficaria pronto no mesmo dia, mas que deve passar por todo o processo de licitação, podendo ocorrer atrasos por vários motivos e disse acreditar poder levar entre três a quatro meses. **Palavra Livre. Encerramento:** o Vereador Gilberto encerrou a visita, agradecendo a presença de todos. Tendo feito as demandas com os responsáveis, o Vereador encerrou a reunião às quinze horas e quarenta e sete minutos.

Vereador Gilberto Matheus Pereira

Vereador Ronaldo Alves Bento

Remo Almeida Machado,

Diretor do SAAE



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Visita Técnica caixa d'água do bairro Rosário

Data: 23/03/2023



MARIANA, MG.



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA

R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Apresentação

No dia 23 de março, os Vereadores Ronaldo Bento e Gilberto Matheus (Tikin) compareceram à caixa d'água do bairro Rosário atendendo ao Requerimento N.º 82/2023. O objetivo foi questionar sobre a situação do reservatório e a previsão de funcionamento, já que os moradores do bairro relatam dificuldades com a falta de água. Também foram convocados o diretor do SAAE e o engenheiro civil da Target Engenharia.



CÂMARA MUNICIPAL DE MARIANA


R Hélvio Moreira Moraes, 358, Vila do Carmo • Mariana/MG • CEP: 35.420-181.

www.camarademariana.mg.gov.br • 31 3557-6200

Relatório Fotográfico da Visita Técnica à Caixa D'Água do Bairro Rosário

Endereço: Rua Cerejeira, Rosário - Mariana, MG.

1)

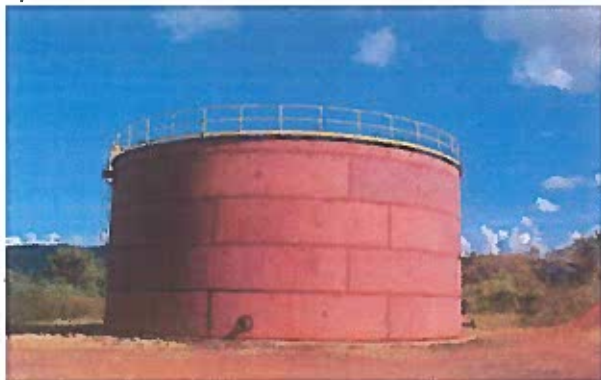

2)



3)



4)



OBSERVAÇÕES

A caixa d'água de um milhão de litros aparentemente pronta, mas sem funcionamento até o momento da visita. Segundo o diretor da autarquia SAAE - Mariana, Remo Machado e o engenheiro civil da Target Engenharia José Eloízio, o IPHAN "barrou" a cor da caixa, pois ela é vista do centro histórico e precisa ser pintada. (fig:1). O engenheiro da Target Engenharia José Eloízio revelou que o projeto foi elaborado para que o abastecimento fosse realizado por baixo (do solo) e, para isso acontecer, seria necessária uma estrutura complexa que não está pronta ainda. Por esse motivo, e para dar funcionalidade ao reservatório, a empresa Target decidiu, junto à autarquia, que a entrada seria por cima do solo (fig:2 e 3). O diretor do SAAE - Mariana Remo Machado explicou que o motivo principal do atraso era devido ao teste de segurança, alegando não ser possível encher o tanque sem a certeza de que é seguro para receber tanta água. Ainda segundo o diretor, o laudo que atestou a segurança do reservatório só foi emitido em março e, devido a isso, não conseguia dizer que a obra estava pronta. O diretor completou que o laudo de segurança foi feito por uma empresa chamada Valettec. O vereador Ronaldo reiterou que a informação que possuía era que a obra terminaria em janeiro, incluindo o tempo para realização do laudo de segurança. O vereador Gilberto perguntou ao diretor Remo se na segunda-feira haverá água no reservatório (caixa d'água) no qual ele responde afirmativo ponderando que não seria a água para distribuição, mas para fazer testes. O vereador Ronaldo expôs não se importar com os detalhes técnicos, mas sim com o prazo de quando a água será distribuída para a população novamente, reclamando ainda da falta de retorno sobre os processos (fig. 4).

Solicitante da visita	Localização	Data
Vereador Gilberto Matheus (Tikin)	Rua Cerejeira, Rosário	23/03/2023

Fotografia: Marina Ferreira (Comunicação da Câmara Municipal de Mariana)
